

# 進捗管理と評価の仕組みづくり



## 次世代エネルギー

超スマート！薩摩川内市  
～みんなで創るエネルギーのまちの未来～

平成26年3月25日

薩摩川内市

新エネルギー対策課



# 進捗管理の推進のポイント

薩摩川内市次世代エネルギービジョン・行動計画を着実に実現していく上でも、進捗管理を適切に進めていくことが求められる。そのために必要なポイントを以下に4点整理した。

## 1. 【既存の個別の事業についての整理と進捗管理】※取組み済

薩摩川内市次世代エネルギービジョン・行動計画づくりと並行して、昨年度から取組んできた様々な施策や具体事業(既存の個別事業)について、行動計画テーマにそれぞれ位置づけて進捗把握と管理を適切に行う。

## 2. 【新たな個別の事業についての整理と進捗管理】※随時取組み中

薩摩川内市次世代エネルギービジョン・行動計画づくりを推進し実現していくに当たり必要な新たな個別の事業を、行動計画テーマにそれぞれ位置づけて進捗把握と管理を適切に行う。

## 3. 【各課等との調整を踏まえた目標設定】※検討中

行動計画に基づいて位置づけられた個々の施策について、福祉、交通等、主たる担当部署がある場合は、それぞれの担当課及び行政評価の担当課である企画政策課と調整して、目的に応じた定性的、定量的な目標の設定を行う(来年度以降実施予定)。

## 4. 【PDCAサイクルの具現化に向けた仕組みの構築】


薩摩川内市次世代エネルギービジョン・行動計画に基づき、個々の施策や事業について、説明力や納得性等を重視しつつ、進捗や目標達成度等を管理し、適時改善等していく仕組みを構築する。

### 3. 計画実現と実行に向けて (3) 行動計画の進捗管理

○行動計画の進行管理のため、Plan(計画)、Do(実行)、Check(点検・検証)、Action(見直し)のPDCAサイクルにより、実施状況を客観的に把握し、必要に応じて見直しを行う。

・点検・検証結果を踏まえ、市が事業主体と連携し、行動計画の進め方について見直しを検討します。  
・今後の進捗が見込めない事業については継続の可否を検討し、また新たに検討する事業についても提案します。

・市が中心となり行動計画をとりまとめ、策定します。次年度以降は、必要に応じて、改訂版として[Action]を踏まえた行動計画を順次策定します。

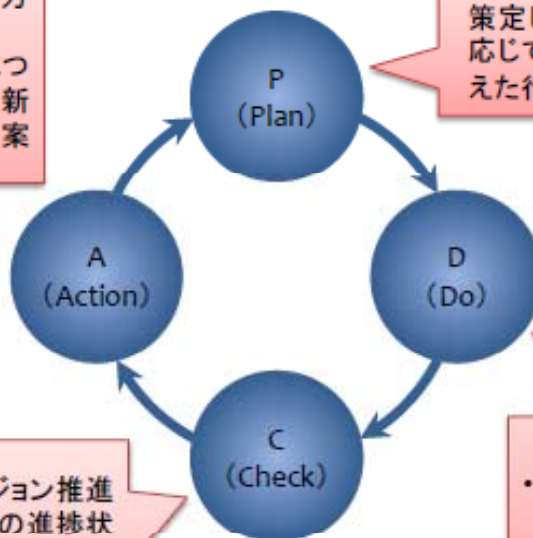

・「薩摩川内市次世代エネルギービジョン推進会議(仮)」が中心となり、行動計画の進捗状況を点検・検証し、必要に応じ具体的なアドバイスを踏まえ方向修正を検討します。  
・ビジョン策定時に実施した市民アンケートについて定期的に再度実施し、市民の考え方の変化などを把握します。

・それぞれの事業主体が、計画に基づいて、課題を一つ一つ解決しながら、具体的に進めていきます。



# 成果目標と評価の仕組みづくり(検討中下案)

## 3.【各課等との調整を踏まえた目標設定】 ⇒ ◎成果目標と評価の仕組みづくり


市全体の行政評価の仕組みと調整しつつ、今年度は進捗管理シートをもとに、「**進捗状況**」の**評価を行うとともに、「達成目標(案)」を一部仮設定し「達成状況」を整理**する。

| 分類  | 番号             | 業務(事業)名   | 作業項目              | 3月  | 進捗コメント | 担当  | 進捗状況<br>評価 | 予算  |     |                                    | 達成目標(案)                        | 達成状況(2014<br>年2月末) | 成果評価(平成28年度末) |       |   |  |  |
|-----|----------------|---|-------------------|-----|--------|-----|------------|-----|-----|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|-------|---|--|--|
|     |                |   |                   |     |        |     |            | F25 | F26 | F27                                |                                |                    | 自己評価          | 市民等評価 | 専 |  |  |
|     | 3-8            | 国の予算の情報収集   | 上記内容に活用できそうな情報の収集 | →   | ...    | ... | ○          |     |     |                                    |                                |                    |               |       |   |  |  |
| 4-1 | エネルギー教育関連事業の実施 | 活用しやすく学びやすいエネルギー教育パンフレットの企画・製作と、小中学校等での効果的な普及啓発事業の推進。 | →                 | ... | ...    | ○   | (5,000)    |     |     | ①対象者(子ども、及び親、他)の理解度向上(アンケート等※実施予定) | ○<br>(数名へのインタビュー結果。アンケートは未実施)  |                    |               |       |   |  |  |
|     |                | 学校等への出前講座等エネルギー関連広報事業の実施                              | →                 | ... | ...    | ○   |            |     |     |                                    |                                |                    |               |       |   |  |  |
|     |                | エネルギー関連広報事業の評価・分析                                     | →                 | ... | ...    | 未   |            |     |     |                                    |                                |                    |               |       |   |  |  |
| 4-2 | 次世代エネルギーシンポジウム | 企画検討、講師選定   |                   | ... | ...    | ○   | 2,000      |     |     | ①参加者数の増加、②参加者の理解度向上(アンケート等)        | ①参加者320名(増加)、②別紙参考資料           |                    |               |       |   |  |  |
|     |                | 委託業務発注、契約手続を関係  |                   | ... | ...    | ○   |            |     |     |                                    |                                |                    |               |       |   |  |  |
|     |                | 実施に向けての各種調整・準備等                                       |                   | ... | ...    | ○   |            |     |     |                                    |                                |                    |               |       |   |  |  |
| 4-3 | 次世代エネルギーフェア    | 企画検討、関係先(企業・学校)へのアプローチ                                |                   | ... | ...    | ○   | 800        |     |     | ①参加者数の増加、②参加者の理解度向上(アンケート等)        | ①約2万人(内数。増加)、②○(数名へのインタビューによる) |                    |               |       |   |  |  |
|     |                | 委託業務発注、契約手続を関係  |                   | ... | ...    | ○   |            |     |     |                                    |                                |                    |               |       |   |  |  |


次頁

# 達成状況例(来場者からの評価)


次世代エネルギー  
シンポジウム参加  
者アンケート結果

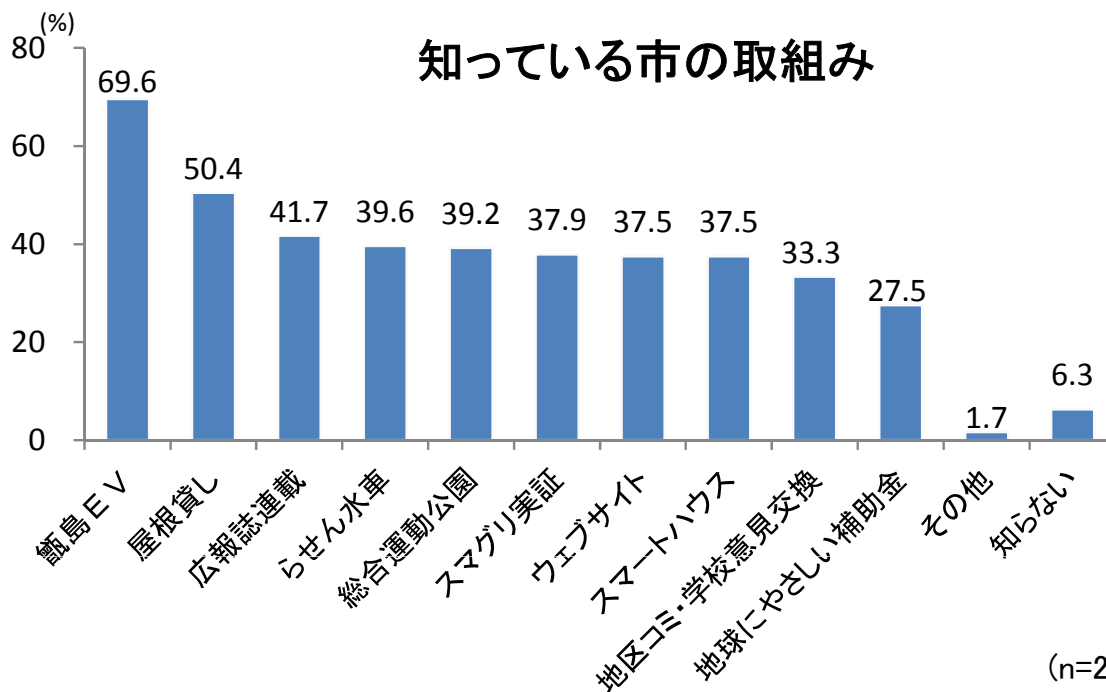

## <山崎亮さんの話>

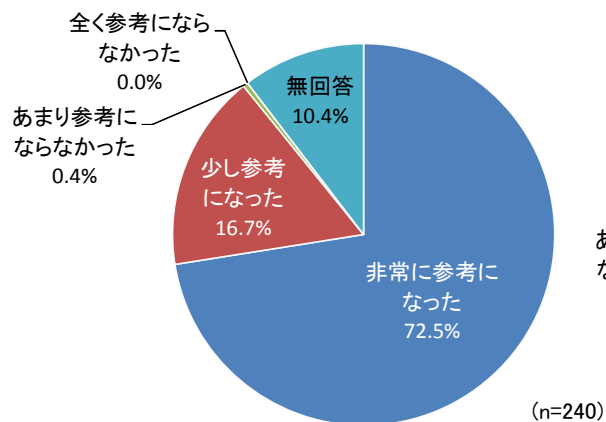

## <パネルディスカッション>

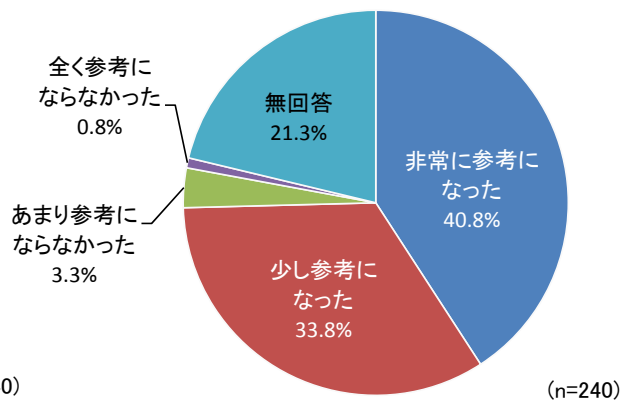

## <次世代エネ活用まちづくり理解>

